
Diagrama de Red

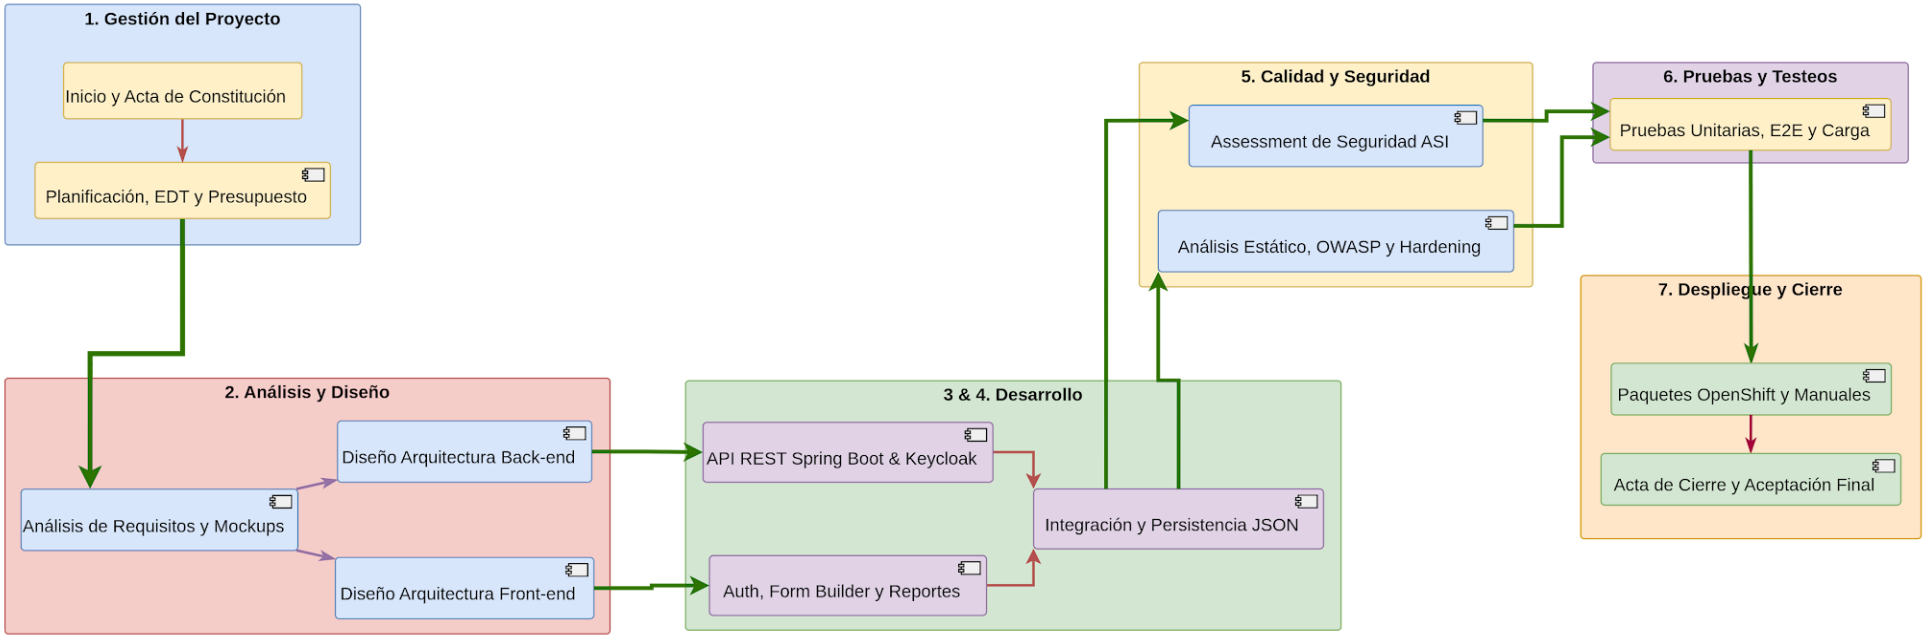

Resumen Diagrama de RED

Para la representación gráfica de la secuencia operativa se ha aplicado el **Método de Diagramación por Precedencia (PDM)** bajo la modalidad de Actividad en el Nodo (AON), adoptando los lineamientos de gestión de proyectos del PMBOK. Con el fin de privilegiar la visualización ejecutiva y evitar la saturación visual, el modelo se estructuró utilizando **actividades resumen y paquetes de trabajo macro** en lugar de individualizar cada micro-tarea de la EDT.

En cuanto a la lógica de ejecución, el modelo distingue claramente entre **tareas estrictamente secuenciales** y **bloques superponibles**: por un lado, la fase inicial de gestión (*Inicio y Acta de Constitución*) y la validación final de cierre exigen una progresión lineal de tipo *Final a Inicio* (FS) sin margen de solapamiento. Por otro lado, el modelo habilita la superposición estratégica en la fase central del proyecto, permitiendo que el *Diseño de Arquitectura Back-end y Front-end* corra en paralelo tras la aprobación de requisitos, y que los procesos de desarrollo técnico, los controles de seguridad (OWASP/Hardening) y las pruebas unitarias e integrales mantengan una ejecución concurrente para optimizar los plazos de entrega previos al despliegue definitivo en la infraestructura de OpenShift.

PMI (Project Management Institute). (2013). Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) — 5ta Edición, Sección 6.3.2.1 (Método de Diagramación por Precedencia).
